



المملكة المغربية

وزارة الداخلية

ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة
إقليم الحسيمة

الحسيمة منارة المتوسط

22 ماي 2017

الحسيمة منارة المتوسط

توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2015 بين يدي صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده

المبلغ الإجمالي : 6,5 مليار درهم

بين سنتي 2015 و 2019

الحسيمة منارة المتوسط

التأهيل المجالي

1

المجال الاجتماعي

2

البنيات التحتية

3

البيئة


4

المجال الديني

5

الحسيمة منارة المتوسط

التركيبة المالية

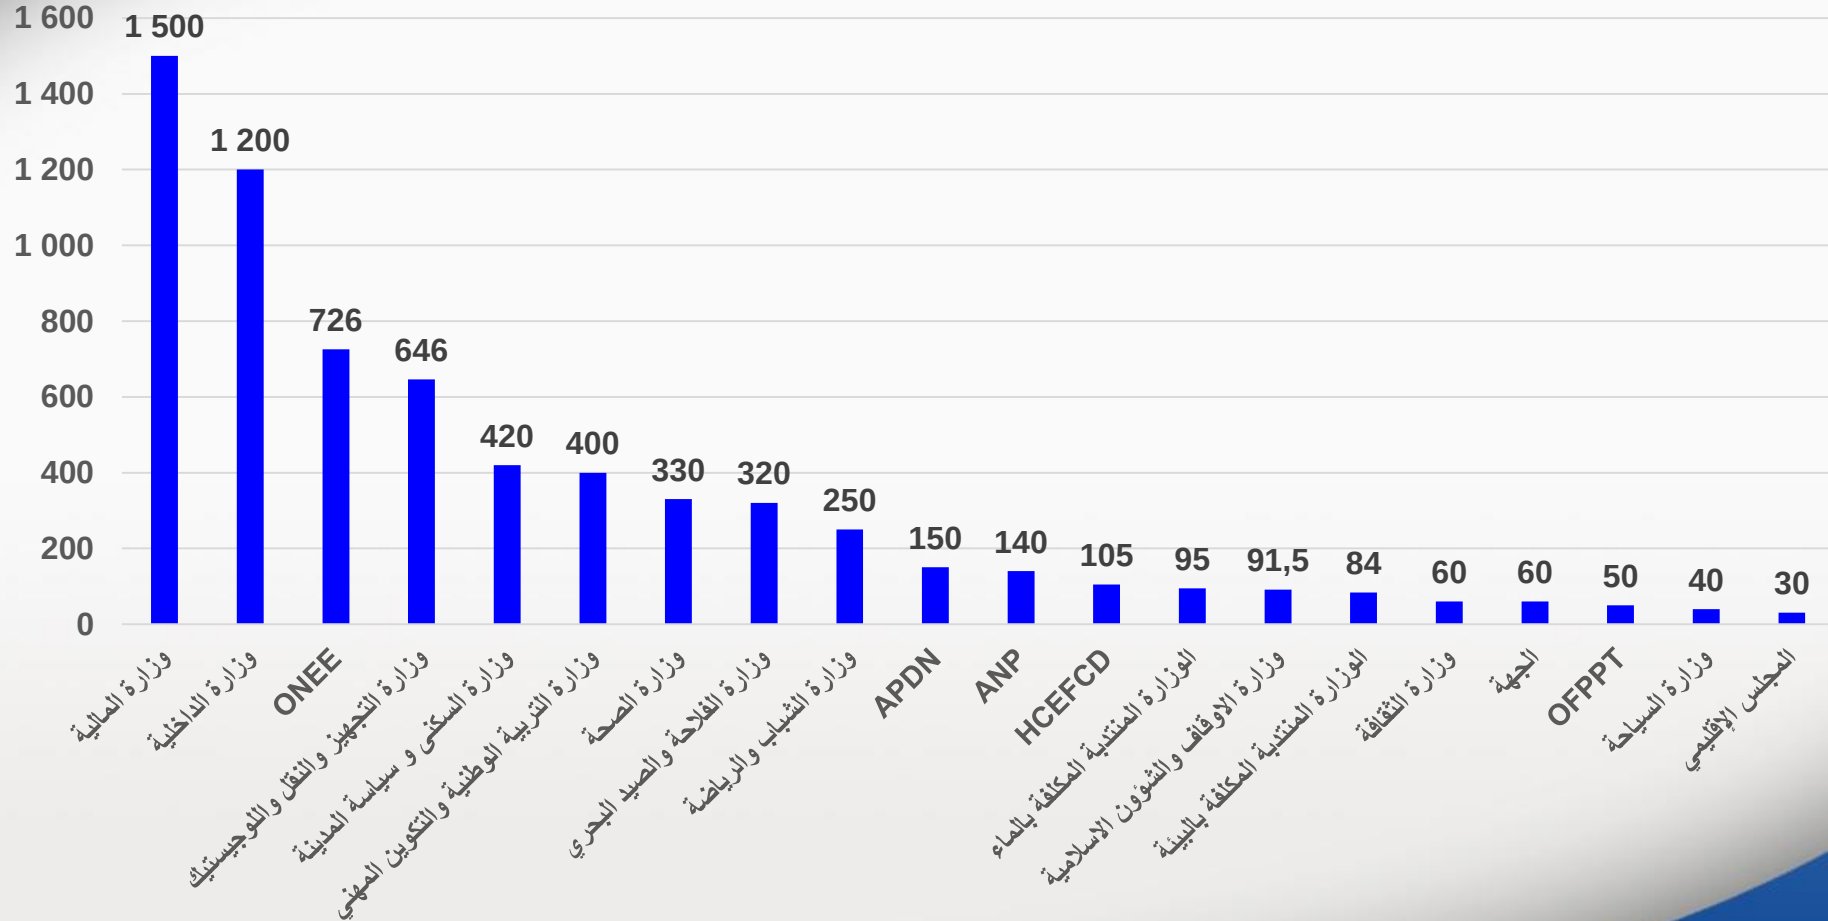

المحاور

المحور الأول: الصحة

المحور الثاني: المجال الاجتماعي

المحور الثالث : الرياضة

المحور الرابع : الطرق و المسالك

المحور الخامس : الفلاحة

المحور السادس : التأهيل المجالي

المحور السابع : الثقافة

المحور الثامن : الماء الصالح للشرب

المحور التاسع : الحماية من الفيضانات

المحور العاشر : التزويد بالماء الصالح للشرب و التطهير

المحور الحادي عشر: إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز و تأهيل المراكز القروية

المحور الثاني عشر : المؤسسات التعليمية

المحور الثالث عشر: المجال الديني

المحور الرابع عشر : التكوين المهني

خلاصة

المحور الأول: الصحة

الصحة

المستشفى المتعدد التخصصات

التكلفة المالية	الموقع	العقار	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
374 مليون درهم	ايت يوسف او علي	خاص	مديرية التجهيزات العامة DEP	28/04/2017

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق حدد في: 01/09/2017

المركز الإقليمي للإستشفائىة

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'AL HOCEIMA





الصحة

المراكز الصحية

نوعية المشاريع	عدد المشاريع	التكلفة المالية (مليون درهم)	عدد المشاريع في طور الانجاز	عدد المشاريع في طور بداية الاشغال
إعادة تهيئة المراكز الصحية	28	26,14	18	10
بناء المراكز الصحية	6	18,97	4	2
المجموع	34	45,1	22	12

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق هو نفسه تاريخ انطلاق الأشغال الفعلي

الصحة

مركز علاج داء السرطان

انطلاق الأشغال	التكلفة المالية (مليون درهم)	الجماعة	
25/04/2017 مدة الإنجاز 3 اشهر	15	الحسيمة	إعادة تهيئة وتجهيز مركز علاج داء السرطان

المحور الثاني: المجال الاجتماعي

المجال الاجتماعي

دور الأمومة

الموقع	التكلفة المالية (مليون درهم)	انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال
تارجيست	2	28/03/2017	10%
السواحل	1,8		10%
اساكن	1,6		10%
بني بوفراح	1,3		10%
بني عمارت	0,77	01/10/2016	95%
المجموع	7,54		

المجال الاجتماعي

دور الطالب

الموقع	التكلفة المالية (مليون درهم)	انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال
مولاي احمد الشريف	2,7	28/03/2017	10%
كتامة	2,8		10%
تاماسوت	2,9		10%
المجموع	8,4		

المجال الاجتماعي

بناء مركز تصفية الكلى

الموقع	التكلفة المالية (مليون درهم)	انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال
امزورن	3,6	26/12/2016	62%

المحور الثالث: الرياضة

القرية الرياضية




الرياضة

الملعب الكبير

التكلفة المالية	الموقع	العقار	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
250 مليون درهم	آيت قامرة	خاص	مديرية التجهيزات العامة DEP	في طور الإعلان عن طلب العروض	30/06/2017



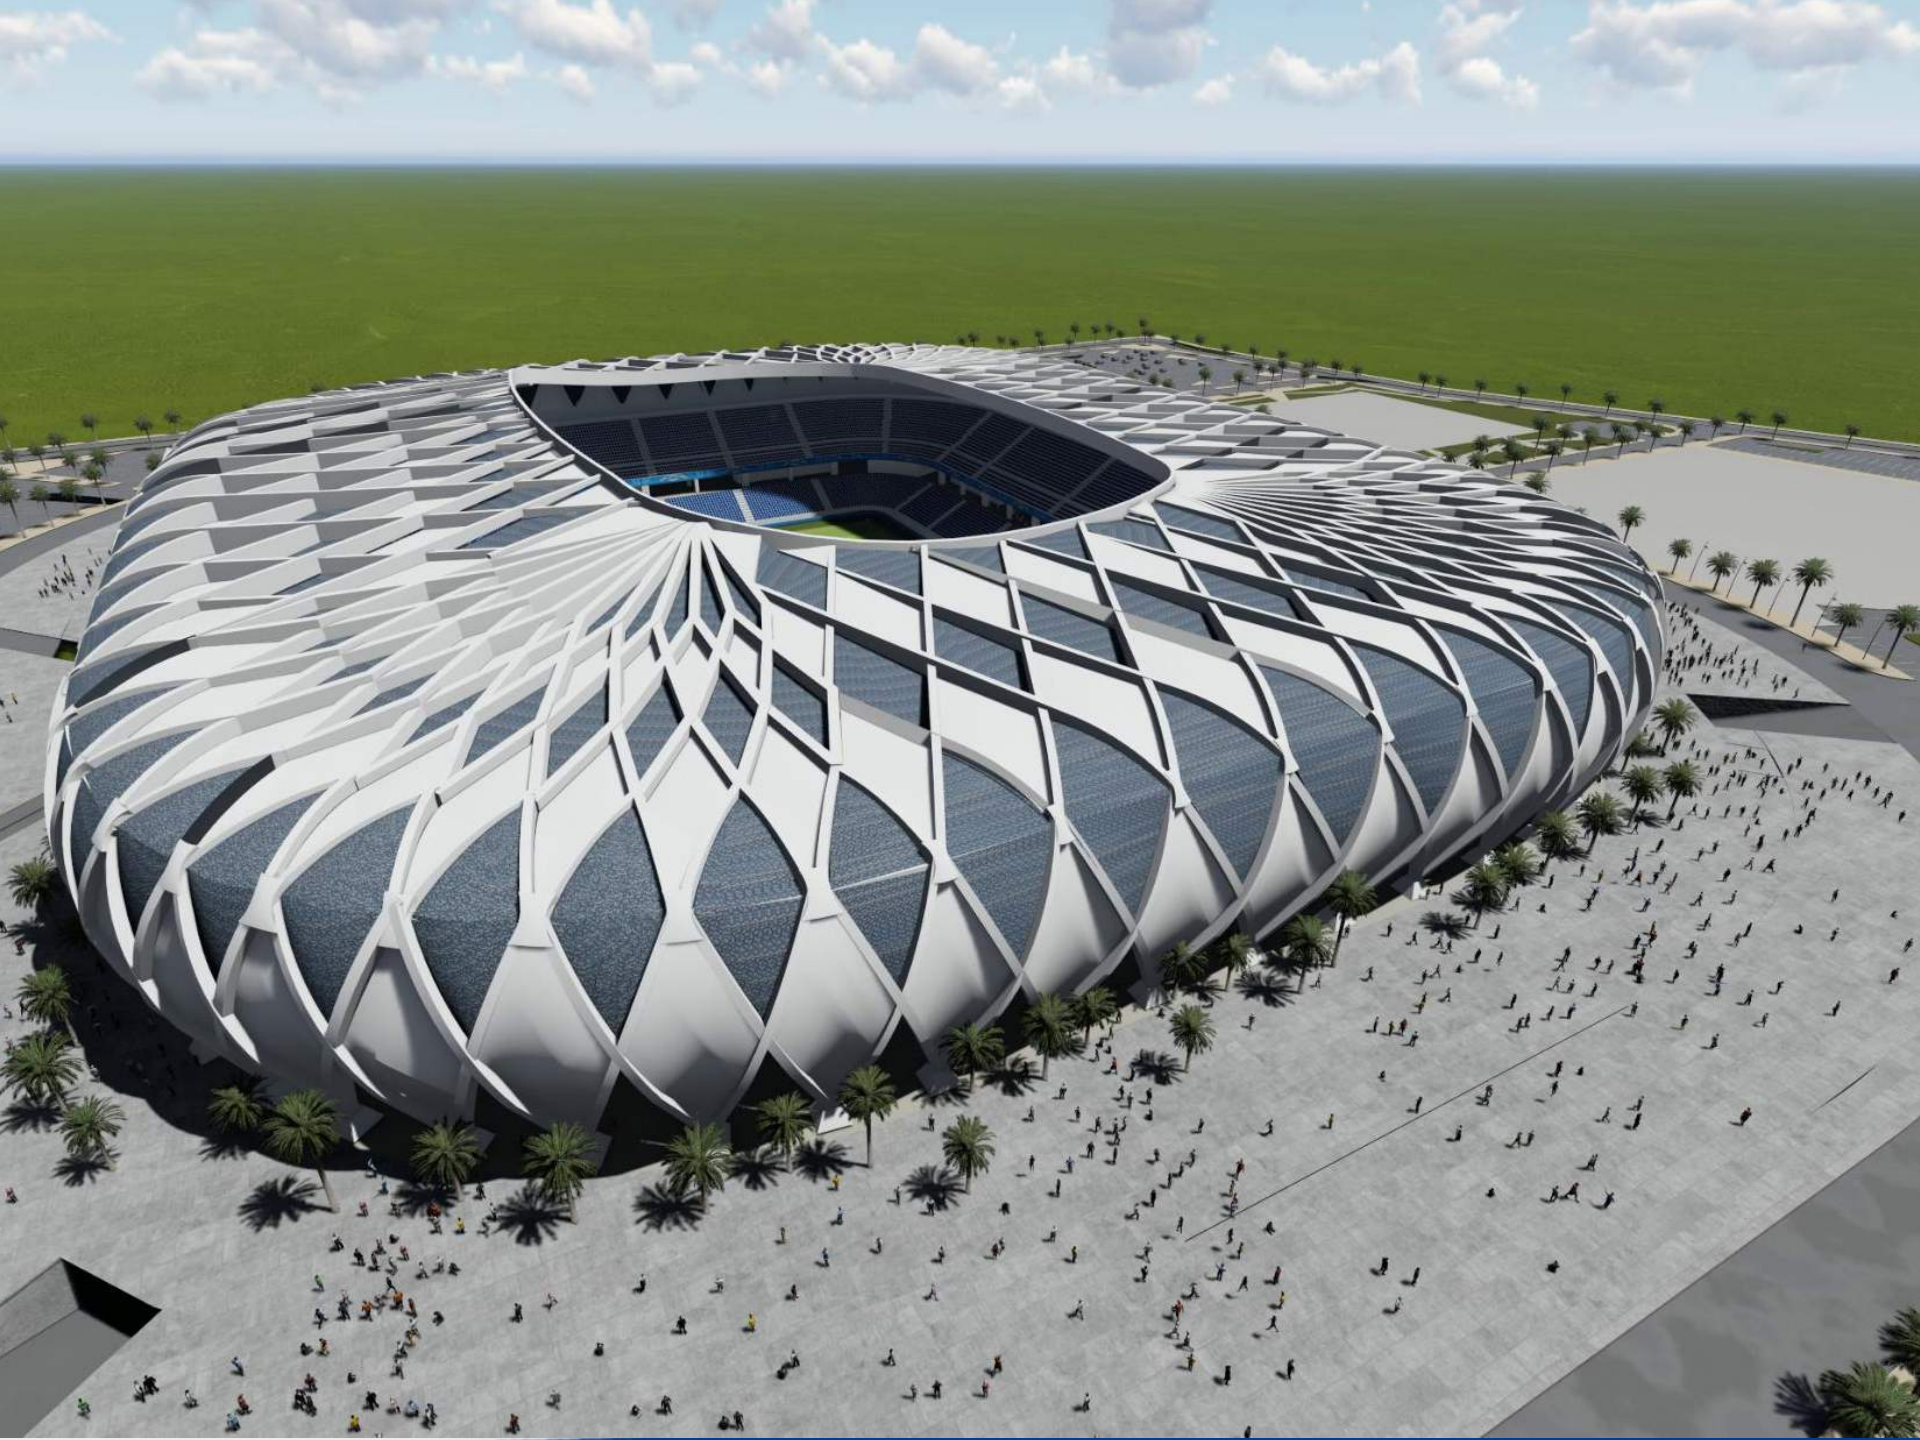



الرياضة

المسبح المغطى

التكلفة المالية	الموقع	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
80 مليون درهم	آيت قامرة	مديرية التجهيزات العامة DEP	الدراسات المعمارية منتهية	01/10/2017

الرياضة

القاعتين المغطاتين أجدير وإساكن

التكلفة المالية	الموقع	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع
10 مليون درهم	أجدير	عمالة إقليم الحسيمة	الدراسات المعمارية منجزة
10 مليون درهم	إساكن	عمالة إقليم الحسيمة	الدراسات المعمارية في طور الانجاز

الرياضة

ملاعب القرب


عدد ملاعب القرب في طور الإنجاز	العدد الكلي لملاعب القرب	التكلفة المالية الاجمالية
22	39	30 مليون درهم

المحور الرابع: الطرق والمسالك

الطرق والمسالك

الطرق

المشروع	التكلفة المالية (مليون درهم)	تاريخ فتح الأظرفة	انطلاق الأشغال
توسيع وتقوية الطريق RP5205 بين تارجست و بني بوفراح على طول 23 كم	136	20/06/2017	ما بين ابريل و أكتوبر 2017
توسيع وتقوية الطريق RP5205 بين بني بوفراح وكلايريس على طول 8 كم	30	31/07/2017	
تقوية الطريق RP5201 بجماعة تاغزوت على طول 13,4 كم	22	26/06/2017	
توسيع وتقوية الطريق RP4115 بجماعة مولاي احمد الشريف على طول 15,4 كم	45	31/07/2017	
توسيع وتقوية الطريق RP5209 بين ط و 2 و الحسيمة عبر جماعتي ازمورن على طول 13 كم	52	31/07/2017	
توسيع وتقوية الطريق RP5207 بين بني حذيفة و مريقة على طول 19,5 كم	70	31/07/2017	
توسيع وتقوية الطريق RR509 بين جماعات اساكين, كتامة و عبد الغاية السواحل على طول 53 كم	270	31/10/2017	
دراسة انشاء الطريق المدارية لمدينتي بني بوعياش و امزورن عبر لوطا وايت قمرة	0,65	31/03/2017	
المجموع	625,65	-	-

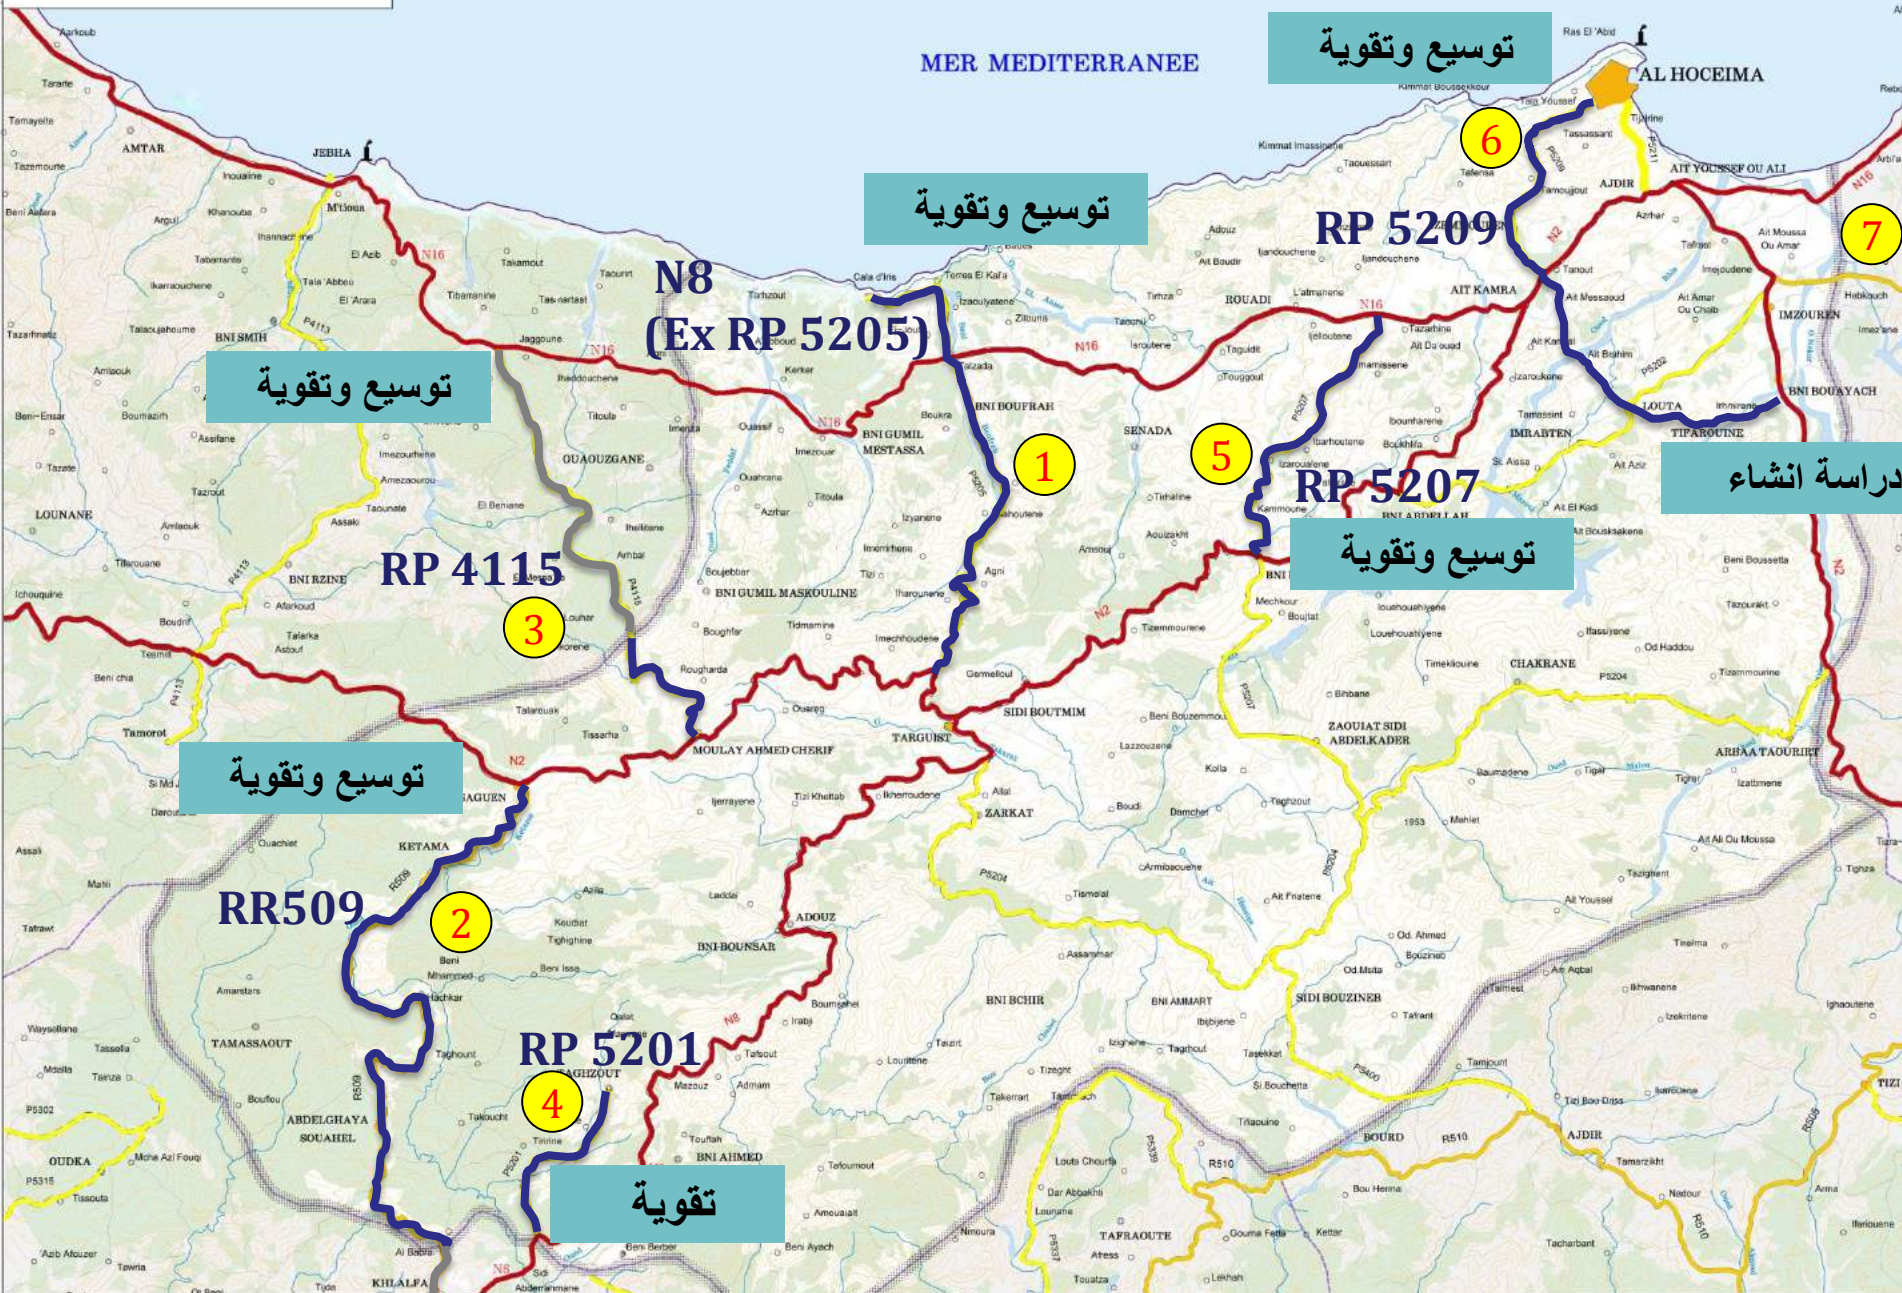

الطرق والمسالك

الطرق-المنشآت الفنية

المشروع	التكلفة المالية (مليون درهم)	تاريخ فتح الأظرفة	انطلاق الأشغال
إعادة بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5205 بجماعة بني بوفراح	5	31/03/2015	منتهية
إعادة بناء 3 منشآت فنية على الطريق RP 5205 بجماعة بني بوفراح	16	31/03/2017	30/04/2017
إعادة بناء 3 منشآت فنية على الطريق RP 5205 بجماعة بني بوفراح	19	30/06/2017	31/07/2017
إعادة بناء 5 منشآت فنية على الطريق RR509 بجماعات اساكين, كتامة و عبد الغاية السواحل	50	31/10/2017	30/11/2017
إعادة بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5202 بجماعة لوطا	5,4	23/05/2017	20/06/2017
إعادة بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5202 بجماعة امرايطن	5,4	23/05/2017	20/06/2017
إعادة بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5202 بجماعة امرايطن	5,4	30/06/2017	31/07/2017
إعادة بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5202 بجماعة امرايطن	5,4	30/06/2017	31/07/2017
بناء 1 منشأة فنية على الطريق RP 5205 على واد غيس بجماعة امرايطن	30	30/06/2017	31/07/2017
المجموع	141,6	-	-

الطرق والمسالك

الطرق – البرنامج التكميلي

المشروع	التكلفة المالية (مليون درهم)	تاريخ فتح الأظرفة
انشاء الطريق الرابطة بين الرواضي وشاطئ بادس على طول 17 كم	27	
انشاء الطريق الرابطة بين شقران تماسينت على طول 20 كم	29	24/05/2017
انشاء الطريق الرابطة بين ايت قامرة و تماسينت على طول 12 كم	28	يوليوز 2017
انشاء الطريق الرابطة بين خلوقت بني جميل على طول 24 كم	26	
المجموع	110	-

MER MEDITERRANEE

شاطرۂ بادس

ايت قامرة الرواضي

بنی جمیل

تماسیت

شقران

مواقع المشاريع

الطرق والمسالك

المسالك

المشروع	التكلفة المالية	الطول	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
فتح وتهئية المسالك قروية ثنائية الطبقة (شطر 1)	134 مليون درهم	100 كم	المديرية الإقليمية للفلاحة	ابريل 2017

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق حدد في: يونيو 2017

الطرق والمسالك

المسالك-البرنامج-

المشروع	الموقع	الطول (كم)	تاريخ فتح الأظرفة	انطلاق الأشغال
مسلك بين ط و 2 و دوار تيدوين	اساكن	4	16/03/2017	14/04/2017
مسلك بين ازار مزدي و دوار حلابة	السواحل	10	21/03/2017	14/04/2017
مسلك بين دوار فراطو و دوار تلاوين	بني عبد الله	6	23/03/2017	14/04/2017
مسلك بين دوار ولاد احمد و دوار تازغوت	سيدي بوزينب	4	28/03/2017	14/04/2017
مسلك بين دوار وجدية و مركز الجماعة	زاوية سيدي عبد القادر	4,6	28/03/2017	17/04/2017
مسلك بين دوار اكناون و دوار جابر	بني جميل	6,5	30/03/2017	17/04/2017
مسلك بين مركز الجماعة و دوار ازبشيرن	بني حمد اموغزن	9	30/03/2017	17/04/2017
مسلك بين ط و 2 و دوار سطح	مولاي احمد الشريف	4	16/05/2017	03/07/2017
مسلك بين دوار تزيتشن و دوار امازوين	مولاي احمد الشريف	9	16/05/2017	03/07/2017

الطرق والمسالك

المسالك-البرنامج-

المشروع	الموقع	الطول (كم)	تاريخ فتح الأظرفة	انطلاق الأشغال
مسلك بين دوار تزيشكن و دوار ايمازوين	مولاي احمد الشريف	2	16/05/2017	03/07/2017
مسلك بين دوار ايت دريس و دوار ايت سعيد	بني عبد الله	8,3	16/05/2017	03/07/2017
مسلك بين مركز بني بشير و دوار تايينيت	بني بشير	10	23/05/2017	10/07/2017
مسلك بين ط و 8 و دوار بومساهرل	بني حمد اموغن	4	23/05/2017	10/07/2017
مسلك في دوار هندون مارة من دوار اكريشن	بني عبد الله	4,5	23/05/2017	10/07/2017
مسلك بين دوار بوخليفة و دوار بونحرن	بني عبد الله	5,2	23/05/2017	10/07/2017
مسلك بين دوار باب سياج و دوار عين بيدا	مولاي احمد الشريف	4,6	23/05/2017	10/07/2017
مسلك بين دوار لمدود دوار عونة ودوار لمدود	بني بوشيببت	5	31/01/2018	31/03/2018

المحور الخامس : الفلاحة

الفلاحة

زراعة 12700 هكتار من الأشجار المثمرة

التكلفة المالية	صاحب المشروع المنتدب	تقدم الأشغال
240 مليون درهم	المديرية الإقليمية للفلاحة	-1530 هكتار منجزة في 2016 -2800 هكتار في طور الإنجاز في 2017 -إطلاق برنامج 2018 في 2017 من أجل تسريع وتيرة الإنجاز

الجماعات المستفيدة: بني عبد الله, بني عمارت, بني بونصار, سيدي بوتميم, سيدي بوزينب, بني حذيفة, سنادة شقران, لوطا, الرواضي, امرابطن, زرقات, زاوية سيدي عبد القادر, عبد الغاية السواحل

الفلاحة

مدارات السقي الصغير والمتوسط

التكلفة المالية	صاحب المشروع المنتدب	عدد الجماعات	الطول	تاريخ فتح الأظرفة	انطلاق الأشغال
11 مليون درهم	المديرية الإقليمية للفلاحة	12	26 كم	ما بين فبراير و ابريل 2017	ماي 2017

الجماعات المستفيدة: عبد الغاية السواحل, مولاي احمد الشريف, بني حمد اموغزن, بني بشير, بني بونصار, امرابطن, لوطا, نكور, تامساوت, تيفروين, زاوية سيدي عبد القادر

المحور السادس : التأهيل المجالي

التأهيل المجالي

الكورنيش

التكلفة المالية	صاحب المشروع المنتدب	تقدم الأشغال	انطلاق الأشغال
450 مليون درهم	عمالة إقليم الحسيمة	الدراسات المعمارية منجزة	10/04/2017

المحور السابع : الثقافة

الثقافة

بناء المسرح

التكلفة المالية	الموقع	العقار	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
35 مليون درهم	الحسيمة	ملك خاص للدولة	عمالة إقليم الحسيمة	10/04/2017

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق حدد في: 15/04/2017









الثقافة

بناء المعهد الموسيقي

التكلفة المالية	الموقع	العقار	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
20 مليون درهم	الحسيمة	ملك خاص للدولة	عمالة إقليم الحسيمة	الدراسات المعمارية منجزة	10/04/2017

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق حدد في: 15/04/2017



CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

معهد
الموسيقى
+ I C H

الثقافة

بناء مركز ثقافي

التكلفة المالية	الموقع	العقار	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
10 مليون درهم	امزورن	ملك خاص للدولة	عمالة إقليم الحسيمة	الدراسات في طور الانجاز	01/10/2017

الثقافة

بناء مركز ثقافي



الثقافة

بناء مركز ثقافي



الثقافة

بناء مركز ثقافي



المحور الثامن : الماء الصالح للشرب

الماء الصالح للشرب

محطة تحلية المياه

التكلفة المالية	الموقع	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
300 مليون درهم	أجدير	المكتب الوطني للماء والكهرباء	01/06/2017

الماء الصالح للشرب

بناء سد على واد غيس

التكلفة المالية	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
1300 مليون درهم	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	03/03/2017

المحور التاسع : الحماية من الفيضانات

الحماية من الفيضانات

الموقع	التكلفة المالية مليون درهم	صاحب المشروع المنتدب	انطلاق الأشغال
ايت يوسف او علي	19	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	01/09/2017
امزورن	8,5	ABHL	امزورن المنطقة الصناعية الأشغال جارية (3,4 م د) 01/06/2017
بني بوعياش	20,30	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	الشطر الأول منجز (10 م د) الأشغال جارية بالنسبة للشطر الثاني
امنود	19	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	01/10/2017
تارجيست	5,85	ABHL	01/06/2017
سنادة	20	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	01/12/2017
بني بوفراح	25	الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء	01/09/2017
المجموع	117,65	-	

المحور العاشر: التزويد بالماء الصالح للشرب و التطهير

التزويد بالماء الصالح للشرب

مدينة الحسيمة

نوع الأشغال	الأحياء المعنية	التكلفة المالية مليون درهم	انطلاق الأشغال
التزويد بالماء الصالح للشرب	أحياء مدينة الحسيمة	25	كل الأشغال في طور الإنجاز
تجديد وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب	أحياء مدينة الحسيمة	6	
المجموع	-	31	

التزويد بالماء الصالح للشرب

الجماعات الأخرى لاقليم الحسيمة

نوع الأشغال	الجماعات المعنية	التكلفة المالية بمليون الدرهم	انطلاق الأشغال
التزويد بالماء الصالح للشرب	الجماعات المجاورة لمدينة الحسيمة	18	في طور الإنجاز
التزويد بالماء الصالح للشرب	نكور، مولاي احمد الشريف، اربعاء تاويرت، كتامة	92	
تجديد وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب	أجدير، إمزورن، إزمورن، رواضي، بني عبد الله، بني كميل، بني بوفراح، آيت كرمة، تماسينت، زرقات، سنادة	41	
المجموع	-	151	

التزويد بالماء الصالح للشرب

دواوير الجماعات الأخرى لاقليم الحسيمة

نوع الأشغال	الجماعات المعنية	التكلفة المالية بمليون درهم	الأشغال المبرمجة
التزويد بالماء الصالح للشرب	ايت يوسف وعلي، سيدي بوتيم، رواضي، تفروين، سنادة، بني كميل، زرقات، بني بوفراح	65	في طور الدراسة وبرمجة الأشغال
	امرابطن، زرقات، اربعاء تاويرت	122	
	جماعة السواهل، كتامة، اساكن، بني بوشيب، ابن احمد ايموكزن	200	
	بني عمارت، سيدي بوزينب، زاوية سيدي عبد القادر، بني بشير	130	
المجموع	-	517	

التطهير السائل لمدينة الحسيمة

نوع الأشغال	الأحياء المعنية	التكلفة المالية مليون درهم	انطلاق الأشغال
التطهير	سيدي عابد, ايكير ازوغاغ, تاساسينت, السوق, تيغانيمين, افزار, سيدي منصور, ميرادور اعلى, بوجيبار	20	كل الأشغال في طور الإنجاز

التطهير وتصفية المياه المستعملة

الجماعات الأخرى لاقليم الحسيمة

نوع الأشغال	الجماعات	التكلفة المالية مليون درهم	انطلاق الأشغال
شبكة التطهير السائل	اجدير, منود, امزورن, بني بوعياش, ايت يوسف او علي, ازمورن, ايت قمره	246	جل الأشغال في طور الانجاز
أنظمة التحويل و محطات معالجة مياه المستعملة	اجدير, سيدي بوعفيف, امزورن, منود ازمورن, ايت قمره	157	
المجموع	-	403	

التطهير وتصفية المياه المستعملة

الجماعات الأخرى لاقليم الحسيمة



مراكز الجماعات الأخرى-التطهير-

الجماعات	تكلفة التجهيز بالشبكة بمليون درهم	تكلفة أنظمة التحويل و الأحواض لاهوائية بمليون درهم	تكلفة أنظمة التحويل و محطات معالجة المياه العادمة بمليون درهم	التكلفة المالية بمليون درهم
بني عبد الله	3,5	1	-	4,5
بني حذيفة	8,4	-	5,8	14,2
زاوية سيدي عبد القادر	3	0,8	-	3,8
بني عمارت	6,6	-	3	9,6
زقرات	3,1	-	3,3	6,4
تارجيست	42	-	28	70
اساكن	11,4	-	7,1	18,6
كتامة	7,4	-	3,1	10,5
رواضي	4,9	-	3,2	8,1
سنادة	11,7	1	-	12,7
بني بوفراح	8,2	1	2,4	11,6
تماسينت	8,1	-	5,2	13,3
المجموع	118,3	3,8	61,1	183,3

خلاصة

الماء الصالح للشرب والتطهير

الأشغال	المجموع	التطهير مليون درهم	الماء الصالح للشرب مليون درهم	الجماعات
كل الأشغال في طور الانجاز	51	20	31	الحسيمة
	737,3	586,3	151	الجماعات الأخرى
في طور الدراسة و برمجة الأشغال	517	-	517	دواوير الجماعات الأخرى
	1 305,3	606,3	699	المجموع

المحور الحادي عشر: إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتأهيل المراكز القروية

اقليم الحسيمة

إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتأهيل المراكز القروية

نوع الأشغال	التكلفة المالية مليون درهم	انطلاق الأشغال
الطرق, الانارة العمومية, المساحات الخضراء	160	كل الأشغال جارية منذ ابريل 2017

ملاحظة : تجدر الإشارة الى ان تاريخ انطلاق الأشغال المعلن خلال العرض السابق حدد في: 01/05/2017

المحور الثاني عشر: المؤسسات التعليمية

المؤسسات التعليمية

نوعية المشاريع	عدد المشاريع	عدد الجماعات المستفيدة	التكلفة المالية الاجمالية
بناء المؤسسات التعليمية	14	11	230 مليون درهم
داخلية	3	3	
تهيئات كبرى	14	10	
إعادة تأهيل الأقسام	220	24	
تعويض حجرات المفكك بالبناء الصلب	140	12	

بداية الأشغال من 01/04/2017 الى 01/10/2017

المحور الثالث عشر: المجال الديني

المجال الديني

بناء مركب إداري وثقافي

التكلفة المالية	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
50 مليون درهم	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	الدراسات منجزة	الأشغال في طور الانطلاق

المجال الديني

بناء وإعادة بناء المساجد

المشروع	الجماعة	التكلفة المالية مليون درهم	انطلاق الأشغال
إعادة بناء مسجد محمد الخامس	الحسيمة	5	الدراسات الهندسية في طور الانطلاق
بناء مسجد بني عمارت	بني عمارت	7	16/01/2017 25% نسبة الأشغال
إعادة بناء مسجد بني حذيفة	بني حذيفة	5	الدراسات في طور الانجاز
إعادة بناء مسجد بدوار او طيل	بني احمد اموكزن	3,5	-
بناء مدرسة قرانية	امزورن	31	الدراسات في طور الانجاز
المجموع	-	41,5	

المحور الرابع عشر: التكوين المهني

التكوين المهني

المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية

الموقع	التكلفة المالية مليون درهم	العقار	صاحب المشروع المنتدب	تقدم المشروع	انطلاق الأشغال
بني بوعياش	25	خاص	مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل	الدراسات في طور الإنجاز	01/09/2017
إساكن	25	ملك خاص للدولة			
المجموع	50	-	-	-	-

خلاصة

الحسيمة منارة المتوسط

خلاصة

الحسيسة منارة المتوسط

التكلفة المالية (مليون درهم)	المحور	
434	الصحة	1
20	المجال الاجتماعي	2
380	الرياضة	3
1 011	الطرق و المسالك	4
251	الفلاحة	5
450	التأهيل المجالي	6
65	الثقافة	7
300	الماء الصالح للشرب	8
118	الحماية من الفيضانات	9
1 305	التزويد بالماء الصالح للشرب و التطهير	10
880	إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز و تأهيل المراكز القروية	11
230	المؤسسات التعليمية	12
92	المجال الديني	13
50	التكوين المهني	14
5 586	المجموع	

خلاصة

الحسمة منارة المتوسط

التكلفة المالية مليون درهم	عدد المشاريع	
2 762,8	226	المشاريع في طور الإنجاز او المنتهية
926,1	255	المشاريع في طور الانطلاق
3 688,9	481	المجموع

برنامج تقليص الفوارق المجالية

إقليم الحسيمة

القطاع	عدد المشاريع	التكلفة المالية مليون درهم
الصحة	46	27
التعليم	216	328
الطرق و المسالك	48	1 282
الماء الصالح للشرب	177	70
الكهرباء	35	2
المجموع	522	1 709

خلاصة عامة

إقليم الحسيمة

البرنامج	التكلفة المالية مليون درهم
الحسيمة منارة المتوسط	6 500
برنامج تقليص الفوارق المجالية	1 709
بناء سد على واد غيس	1 300
البرنامج التكميلي - الطرق	400
المجموع	9 909 مليون درهم
